

# Il monitoraggio del progetto Italia Login

**Nicola de Chiara**  
Agenzia per l'Italia Digitale

19 aprile 2023

# Il Progetto Italia Login



## Italia Login – La casa del cittadino Agenzia per l'Italia Digitale

#efficacia

#e-gov

Il Progetto "Italia Login – la casa del cittadino" nasce per accompagnare e supportare le Pubbliche Amministrazioni nel processo di trasformazione digitale, in una logica di trasparenza, semplificazione ed efficienza.



Beneficiario  
**Agenzia per l'Italia  
Digitale**



Risorse assegnate  
**50.000.000,00 euro**



A regia di  
**Organismo  
Intermedio -  
Dipartimento della  
Funzione Pubblica**



Asse: **1/2**  
Obiettivo Specifico:  
**1.3/2.2**  
Azione: **1.3.1/2.2.1**




CUP  
**C51H16000080006**




Durata  
**2016-2023**

# Il Monitoraggio del Progetto Italia Login

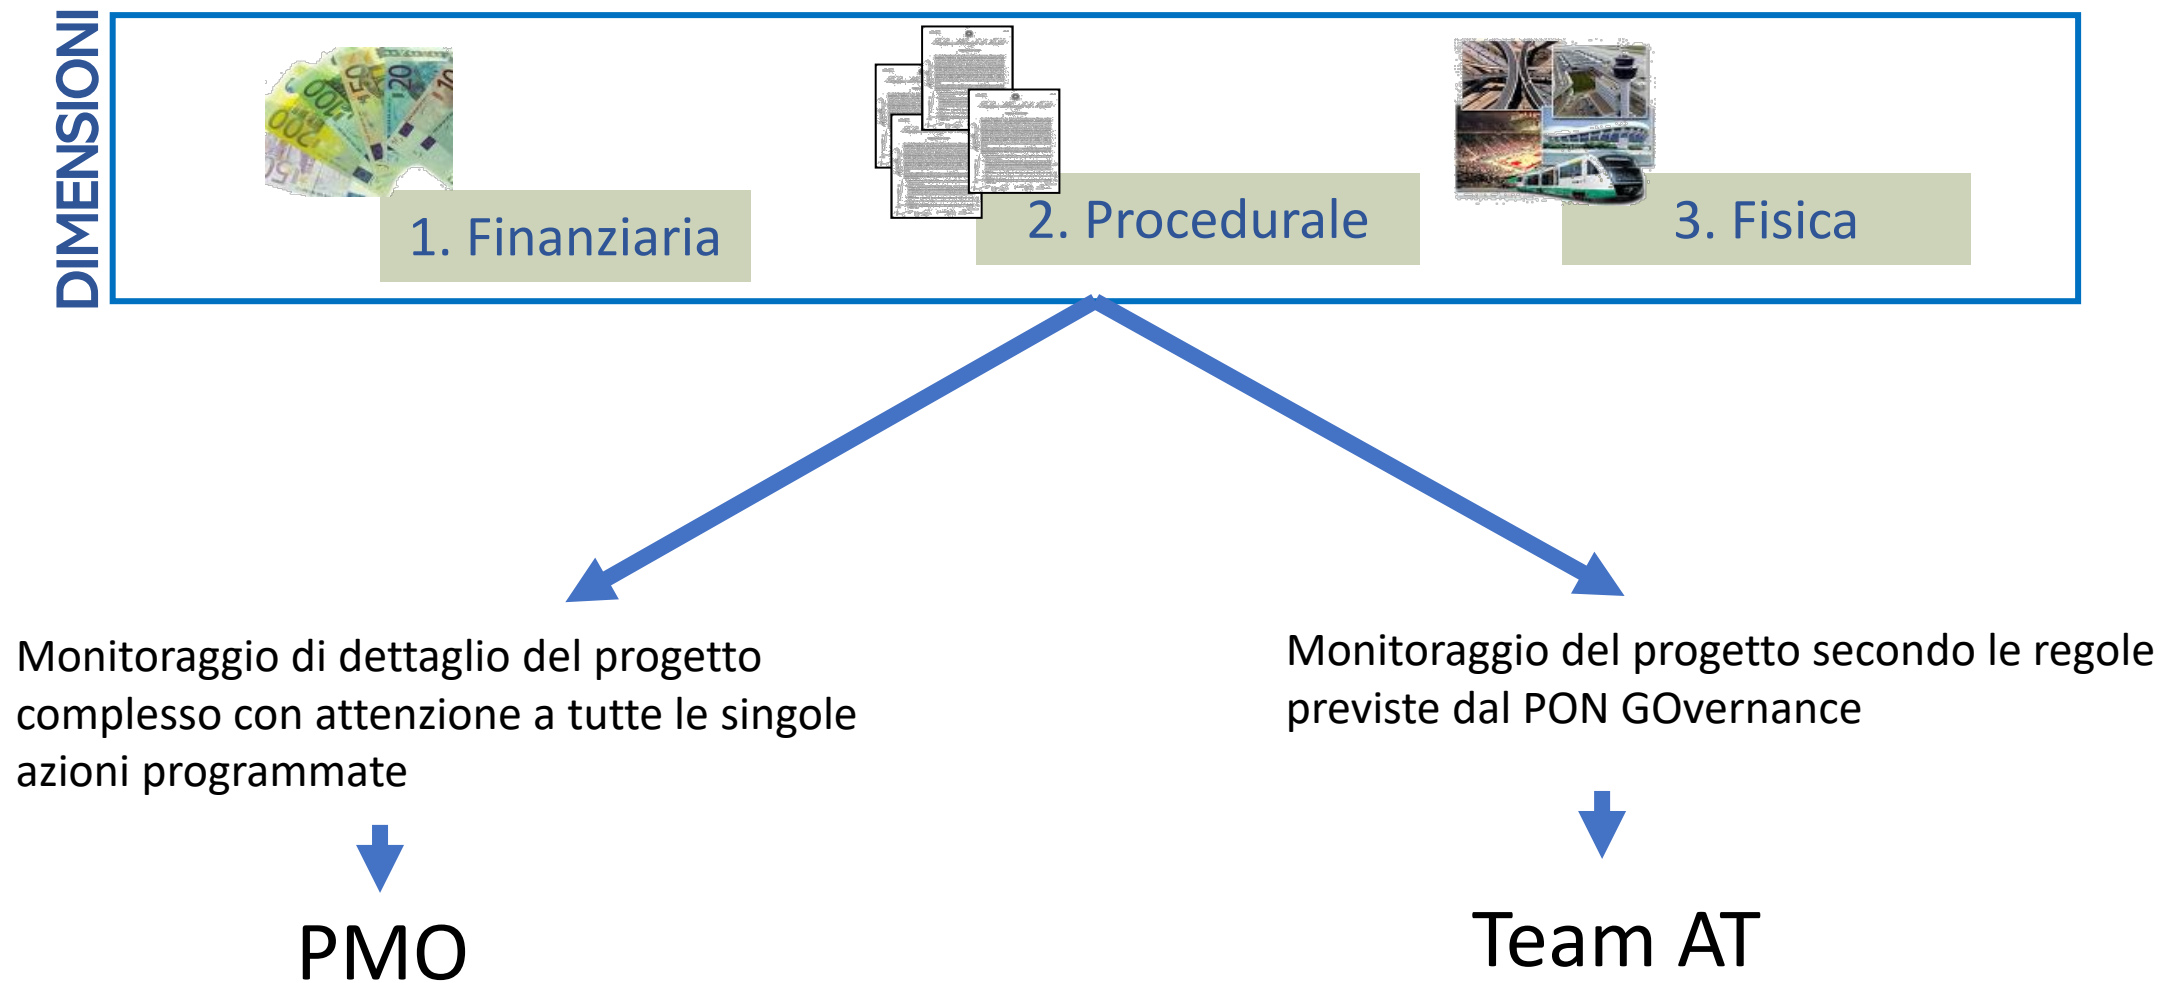

# Il monitoraggio del progetto Italia Login - DELFI



- Impegni
- Giustificativi
- Pagamenti
- Piano dei costi

- Aggiornamento date inizio e fine esecuzione

- Aggiornamento avanzamento degli indicatori

# Il monitoraggio del progetto Italia Login – Avanzamento fisico



## 3. Fisica

### Indicatori di Risultato

- 6RIS: Quota di operatori che hanno completato con successo i percorsi di rafforzamento delle competenze digitali
- 7RIS: Amministrazioni che si sono riorganizzate
- 13RIS: Amministrazioni locali con collegamenti e scambi dati con altre pubbliche amministrazioni

### Indicatori di Output

- 50OUT Numero di Amministrazioni/Uffici/Strutture coinvolte in nuovi processi di riorganizzazione, e di razionalizzazione della propria struttura organizzativa, di ridefinizione delle modalità di erogazione dei servizi (...)
- 40OUT Numero di Operatori coinvolti in percorsi di rafforzamento delle competenze digitali
- 12OUT: Numero di servizi co-progettati e/o erogati in forma associata e interoperabile da diverse amministrazioni e resi disponibili a cittadini ed imprese in una logica di single-sign-on

# Il monitoraggio del progetto Italia Login – Avanzamento fisico



## 3. Fisica

### Indicatori di Risultato

- 6RIS: Quota di operatori che hanno completato con successo i percorsi di rafforzamento delle competenze digitali
- 7RIS: Amministrazioni che si sono riorganizzate
- 13RIS: Amministrazioni locali con collegamenti e scambi dati con altre pubbliche amministrazioni

### Indicatori di Output

- 50OUT Numero di Amministrazioni/Uffici/Strutture coinvolte in nuovi processi di riorganizzazione, e di razionalizzazione della propria struttura organizzativa, di ridefinizione delle modalità di erogazione dei servizi (...)
- 40OUT Numero di Operatori coinvolti in percorsi di rafforzamento delle competenze digitali
- 12OUT: Numero di servizi co-progettati e/o erogati in forma associata e interoperabile da diverse amministrazioni e resi disponibili a cittadini ed imprese in una logica di single-sign-on

# Il monitoraggio del progetto Italia Login – Avanzamento fisico



3. Fisica

Indicatori di Risultato

Indicatori di Output

DEFINIZIONE DI UNA METODOLOGIA

# Il monitoraggio del progetto Italia Login – Avanzamento fisico

## Indicatori di Output

- 5OUT Numero di Amministrazioni/Uffici/Strutture coinvolte in nuovi processi di riorganizzazione, e di razionalizzazione della propria struttura organizzativa, di ridefinizione delle modalità di erogazione dei servizi (...)

Il valore unitario che sarà preso in considerazione per la valorizzazione dell'indicatore sarà il numero di amministrazioni che saranno coinvolte in processi di riorganizzazione o razionalizzazione della struttura o ridefinizione delle modalità di erogazione dei servizi. Nell'ambito della medesima amministrazione, se l'erogazione di un medesimo servizio deriva dal contributo di più uffici riorganizzati, l'amministrazione verrà conteggiata solo una volta

### DESCRIZIONE

### FONTE

- *Sistema informativo e piattaforma gestionale realizzata nell'ambito dell'attività di accompagnamento alle Pubbliche Amministrazioni da parte di AGID*
- *Piattaforma di Analytics di SPID;*
- *Piattaforma sistema Museale;*
- *Piattaforme di servizi di e-procurement e di appalti di innovazione*
- *Toll di risk assessment*
- *Portale Dati.gov.it*



# Il monitoraggio del progetto Italia Login – Avanzamento fisico

## Indicatori di Output

- 4OUT Numero di Operatori coinvolti in percorsi di rafforzamento delle competenze digitali

### DESCRIZIONE

Il valore unitario utilizzato per individuare la realizzazione dell'indicatore sarà il numero di operatori che parteciperanno alle attività di rafforzamento previste in fase di accompagnamento a seguito della stipula degli accordi con le Amministrazioni.

In tale contesto con "operatore" si intende il singolo partecipante alle attività di rafforzamento delle competenze.

### FONTE

*Sistema informativo e piattaforma gestionale realizzata nell'ambito dell'attività di accompagnamento alle Pubbliche Amministrazioni da parte di AGID che consente il censimento delle attività e l'archiviazione della documentazione a supporto (tra queste la documentazione e i verbali dell'accompagnamento). Per gli incontri in videoconferenza, invece, verranno utilizzati i dati delle partecipazioni presenti sulla piattaforma utilizzata per erogare l'attività o altra forma idonea per la raccolta dei dati minimi di partecipanti (ad es. Amministrazione di riferimento, Sede lavoro (regione), fascia di età).*

# Il monitoraggio del progetto Italia Login – Avanzamento fisico

## Indicatori di Output

- 12OUT: Numero di servizi co-progettati e/o erogati in forma associata e interoperabile da diverse amministrazioni e resi disponibili a cittadini ed imprese in una logica di single-sign-on

### DESCRIZIONE

La tipologia di servizi presi in considerazione è quella di servizi ridefiniti e co-progettati con le amministrazioni centrali e locali, grazie al supporto di AGID e in ottemperanza delle indicazioni del Piano Triennale per la PA.

### FONTE

- Documentazione di progettazione e di rilascio
- Piattaforme di servizi di e-procurement e di appalti di innovazione
- Registrazione al portale;
- Convenzione di utilizzo;
- Mail di adesione

# Il monitoraggio del progetto Italia Login – Avanzamento fisico

## Indicatori di Risultato

- 6RIS: Quota di operatori che hanno completato con successo i percorsi di rafforzamento delle competenze digitali

### DESCRIZIONE

Il valore preso in considerazione è il numero di operatori così come descritti nel corrispondente indicatore 4OUT

### FONTE

- *Sistema informativo e piattaforma gestionale realizzata nell'ambito dell'attività di accompagnamento alle Pubbliche Amministrazioni da parte di AGID che consente il censimento delle attività e l'archiviazione della documentazione a supporto (tra queste la documentazione della formazione)*
- *Piattaforma di webinar dalla quale reperire i questionari di valutazione finale.*

# Il monitoraggio del progetto Italia Login – Avanzamento fisico

## Indicatori di Risultato

- 7RIS: Amministrazioni che si sono riorganizzate

### DESCRIZIONE

Il valore preso in considerazione è il numero di Amministrazioni così come descritti nel corrispondente indicatore di 5OUT

### FONTE

- *Sistema informativo e piattaforma gestionale realizzata nell'ambito dell'attività di accompagnamento alle Pubbliche Amministrazioni da parte di AGID*

# Il monitoraggio del progetto Italia Login – Avanzamento fisico

## Indicatori di Risultato

- 13RIS: Amministrazioni locali con collegamenti e scambi dati con altre pubbliche amministrazioni

### DESCRIZIONE

Viene calcolato la percentuale di utilizzo degli scambi dati tra amministrazioni in modalità off-line e tramite cooperazione applicativa per tipologia di amministrazione sulla base della metodologia definita da ISTAT

### FONTE

*ISTAT*

# Il monitoraggio del progetto Italia Login – Avanzamento fisico



## 3. Fisica

## Indicatori di Output

- 5OUT Numero di Amministrazioni/Uffici/Strutture coinvolte in nuovi processi di riorganizzazione, e di razionalizzazione della propria struttura organizzativa, di ridefinizione delle modalità di erogazione dei servizi (...)
- 4OUT Numero di Operatori coinvolti in percorsi di rafforzamento delle competenze digitali
- 12OUT: Numero di servizi co-progettati e/o erogati in forma associata e interoperabile da diverse amministrazioni e resi disponibili a cittadini ed imprese in una logica di single-sign-on



100%
